República de Chile
Provincia de Linares
Dirección Asesoría Jurídica

APRUEBA LIQUIDACIÓN CONTRATO DEL 22 DE ABRIL DEL 2016 SUCRITO CON LA CONSTRUCTORA "GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.", PARA EJECUTAR EL PROYECTO "*CONSTRUCCIÓN PISCINA TERAPÉUTICA TEMPERADA COMUNA DE PARRAL"* SEGÚN INFORME DEL 26-4-2022./

DECRETO EXENTO N° 2351 **/**

Parral, 23 MAY 2022

VISTOS:

a) Las facultades de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
b) La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
c) Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.
d) Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
e) Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.
f) El Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*", Código BIP N° 30.396.180-0
g) La Resolución (E) N° 7.206 del 15 de diciembre del 2015 del Gobierno Regional del Maule que aprueba el convenio de transferencia de recursos FRIL 2015, para ejecución del proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*", Código BIP N° 30.396.180-0.
h) El Decreto Exento N° 83 del 07 de enero del 2015 que aprueba por parte del Municipio el convenio de transferencia de recursos FRIL 2015 con el Gobierno Regional del Maule, para ejecución del proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*", Código BIP N° 30.396.180-0.
i) El Decreto Exento N° 390 del 20 de enero del 2016 que aprueba Bases Administrativas especiales, especificaciones técnicas, anexos y demás antecedentes de la licitación pública "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*".
j) El Decreto Exento N° 1.102 del 26 de febrero del 2016 que adjudica el llamado a Licitación Pública para el Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*" a empresa constructora ENCO LTDA.
k) El Decreto Exento N° 2.096 del 11 de abril del 2016 que deja sin efecto la adjudicación de la licitación Pública del proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*" a favor de la empresa Constructora ENCO LTDA., y readjudica la Licitación Pública a la Empresa GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA
l) El Contrato Ad-referéndum suscrito con fecha 22 de abril del 2016 entre la I. Municipalidad de Parral y la Empresa "GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.", para ejecutar el Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*".
m) El Decreto Exento N° 2.356 del 22 de abril del 2016 que tiene por aprobado el contrato anterior.
n) El Informe "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*" fecha 26 de abril del 2022 emitido por Don Eduardo Espinosa y por Don Víctor Valverde, ambos funcionarios de la Dirección de Obras Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Decreto Exento N° 2.356 del 22 de abril del 2016 se aprobó el Contrato Ad-referéndum suscrito con fecha 22 de abril del 2016 entre la I. Municipalidad de Parral y la Empresa "GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.", para ejecutar el Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*".

2. Que, atendido el estado de avance del Proyecto tanto físico como financiero, Don Víctor Valverde Romero Director la Dirección de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica del contrato y Don Eduardo Espinosa Martínez, Profesional de la DOM, en su calidad de Inspector Técnico de la Obra, emitieron el Informe "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*" fecha 26 de abril del 2022 dando cuenta de la situación actual del Proyecto.

3. Que, no habiendo nada que observar, no queda sino aprobar el informe anterior y por ello dar por liquidado el contrato suscrito con fecha 22 de abril del 2016 entre la I. Municipalidad de Parral y la Empresa "GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.", para ejecutar el Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*".

D E C R E T O:

I. **APRUEBESE,** la liquidación del contrato suscrito con fecha 22 de abril del 2016 entre la I. Municipalidad de Parral y la Empresa Constructora "GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.", para ejecutar el Proyecto "*Construcción Piscina Terapéutica temperada Comuna de Parral*", todo de acuerdo al Informe de su Unidad Técnica y de su Inspector Técnico, emitido el 26 de abril del 2022 cuyo tenor literal se reproduce como sigue, en lo que interesa:

"(…)

2.0.0.- ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaron según el siguiente cuadro:

N° ESTADO DE PAGO	FINANCIAMIENTO	MONTO		DECRETO DE PAGO N°	FECHA	ESTADO
		PARCIAL	ACUMULADO			
1	GORE Maule	$ 8.268.715	$ 8.268.715	1758	04-08-2016	Pagado
2	GORE Maule	$ 20.491.562	$ 28.760.277	2068	06-09-2016	Pagado
3	GORE Maule	$ 16.829.736	$ 45.590.013	2442	13-10-2016	Pagado
4	GORE Maule	$ 11.648.000	$ 57.238.013	55	09-01-2018	Pagado
5	GORE Maule	$ 19.861.933	$ 77.099.946	824	20-04-2018	Pagado
6	GORE Maule	$ 11.911.900	$ 89.011.846	62	11-01-2019	Pagado
7	GORE Maule	$ 3.054.861	$ 92.066.707	280	14-02-2022	Pagado

Observación: El Estado de Pago N°7 y final se realizó mediante transferencia T-111 de fecha 17-02-2022.

3.0.0.- GARANTÍAS

3.0.1.- Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato:

NOMBRE	*GLG Ingeniería y Montaje Ltda.*
RUT	*76.402.141-K*
REPRESENTANTE LEGAL	*Daniel Emilio Césped Müller*
DOMICILIO	*Avenida República de Chile N° 667 Villa Manso de Velasco*
CIUDAD	*Rancagua*
TIPO DE GARANTÍA	*Certificado de Fianza Pagadero a la Vista / Nominativo / No Negociable / Irrevocable "En Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Construcción Piscina Terapéutica Comuna de Parral ID N°2600-3-LP16"*
N° DE FOLIO	*B0024860*

CÓDIGO VERIFICACIÓN	*9508305100x079CAE*
COMPAÑÍA.	*MásAval Sociedad de Garantía Recíproca*
MONTO	*$ 9.206.671.-*
FECHA EMISION DCTO.	*07 de Septiembre de 2017.*
FECHA VENCIMIENTO DCTO.	*14 de Diciembre de 2018.*
ESTADO	*Liberada.*

3.0.2.- Garantía por Correcta Ejecución de la Obra: *Con respecto a este documento, con fecha 22 de marzo de 2022 se hace la consulta al GORE Maule si el monto de la garantía permanece en arcas municipales o se debe reembolsar al GORE, respondiendo éste que el Municipio puede disponer de esos recursos en sus arcas.*

NOMBRE	*GLG Ingeniería Y Montaje Ltda.*
RUT	*76.402.141-K*
REPRESENTANTE LEGAL	*Daniel Emilio Césped Müller*
DOMICILIO	*Avenida República de Chile N° 667 Villa Manso de Velasco*
CIUDAD	*Rancagua*
TIPO DE GARANTÍA	*Certificado de Fianza Pagadero a la Vista / Nominativo / No Negociable / Irrevocable "En Garantía por Correcta Ejecución de la Obra Construcción Piscina Terapéutica Comuna de Parral ID N°2600-3-Lp16"*
N° DE FOLIO	*B0031579*
CÓDIGO VERIFICACIÓN	*70100146910x0F7BA3*
COMPAÑÍA	*MásAval Sociedad de Garantía Recíproca*
MONTO	*$ 4.650.000.-*
FECHA EMISION DCTO.	*11 de Diciembre de 2018.*
FECHA VENCIMIENTO DCTO.	*05 de Abril de 2020.*
ESTADO	*Cobrada.*

4.0.0.- SEGUROS

NOMBRE ASEGURADO	*GLG Ingeniería y Montaje Ltda.*
RUT	*76.402.141-K*
NOMBRE CONTRATANTE	*GLG Ingeniería y Montaje Ltda.*
DOMICILIO	*Avenida República de Chile N° 667 Villa Manso de Velasco*
CIUDAD	*Rancagua*
TIPO DE PÓLIZA	*- Todo Riesgo Construcción* *- Sismo Todo Riesgo de Construcción* *- Responsabilidad Civil*
CÓDIGO PÓLIZA	*POL 120130089 SVS*
CÓDIGO VERIFICACIÓN	*9508305100x079CAE*
COMPAÑÍA	*Renta Nacional*
MONTOS ASEGURADOS	*- Valor Contrato : 3.322 UF* *- Responsabilidad Civil : 1.329 UF*
INICIO VIGENCIA	*25 de Abril de 2016.*
TÉRMINO VIGENCIA	*15 de Septiembre de 2016.*
ESTADO	*Vencido.*

5.0.0.- PRESUPUESTO

ITEM	***ESPECIFICACION***	***UNI***	***CANTIDAD***	***P. UNIT.***	***TOTAL***
0.0	***GENERALIDADES***				

0.1.	Letrero de Obra	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
0.2	Ensayos y Muestreos	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
0.3	Derechos/Permisos	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.	**OBRAS PREVIAS**				
1.1	**Instalaciones Provisorias**				
1.1.1	Permisos Electricos	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.1.2	Permisos Instalaciones de Gas	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.1.3	Permisos Agua Potable	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.2	**Construcciones Provisorias**				
1.2.1	Instalacion de Faenas	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.2.2	Construccion Oficinas	Incluidos en Gastos Generales y Utilidades			
1.3	**Trabajos Previos**				
1.3.1	Limpieza y despeje del terreno	m2	18,0	$ 15.000	$ 270.000
1.3.2	Rebaje capa vegetal	m2	18,0	$ 6.000	$ 108.000
1.3.3	Demoliciones de pavimentos existentes y otros elementos	GL	1	$ 500.000	$ 500.000
1.3.4	Replanteo, trazado y niveles	GL	1	$ 700.000	$ 700.000
2.	**OBRA GRUESA**				
2.1	Excavaciones y movimiento de tierra	m3	155	$ 21.000	$ 3.255.000
2.2	**CIMIENTOS**				
2.2.1	Emplantillado	m3	3,5	$ 90.000	$ 315.000
2.2.2	Enfierradura cimiento	kg	220	$ 1.000	$ 220.000
2.2.3	Hormigon cimiento	m3	13,0	$ 110.000	$ 1.430.000
2.3	**SOBRECIMIENTO**				
2.3.1	Enfierradura sobrecimiento	kg	380	$ 1.000	$ 380.000
2.3.2	Moldaje sobrecimineto	m2	40	$ 6.000	$ 240.000
2.3.3	Hormigon sobrecimiento	m3	6,1	$ 110.000	$ 671.000
2.4	**PAVIMENTOS**				
2.4.1	Relleno y estabilizacion de suelo	m3	32	$ 20.000	$ 640.000
2.4.2	Cama de ripio	m3	32	$ 15.000	$ 480.000
2.4.3	Polietileno	m2	180	$ 1.500	$ 270.000
2.4.4	Radier	m3	12,8	$ 110.000	$ 1.408.000
2.4.5	Malla Acma C-196	m2	128	$ 5.000	$ 640.000
2.4.6	Radier piscina	m3	13,5	$ 110.000	$ 1.485.000
2.4.7	Enfierradura Radier	kg	780	$ 1.000	$ 780.000
2.5	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**				
2.5.1	Muros de hormigon armado				
2.5.1.1	Hormigon Armado	m3	17,8	$ 110.000	$1.958.000
2.5.1.2	Acero de Refuerzo	kg	1236	$ 1.000	$ 1.236.000
2.6	**ELEMENTOS SEPARADORES VERTICAL**				
2.6.1	Tabiqueria metalica metalcom	m2	121	$ 17.000	$ 2.057.000
2.6.2	OSB 9,5 mm	m2	430	$ 10.000	$ 4.300.000
2.7	**ESTRUCTURA DE TECHUMBRE**				
2.7.1	Estructura de Metalcom				
2.7.2	Cerchas	UN	4	$ 150.000	$ 600.000
2.8	**Cubierta**				
2.8.1	PV4 prepintado blanco	m2	17,5	$ 17.000	$ 297.500
2.8.2	Proteccion Hidrica				
2.8.2.1	Canales de aguas lluvias, cumbreras, forros	ml	15	$ 6.000	$ 90.000
2.9.2.2	Bajadas de aguas lluvias	ml	4	$ 6.000	$ 24.000
3.	**Terminaciones**				

3.1	Aislacion Termica				
3.1.1	Aislanglass rollo libre cielo	m2	147	$ 5.000	$ 735.000
3.2	**Aislacion muro**				
3.2.1	Aislanglass rollopapel	m2	297	$ 5.000	$ 1.485.000
3.3	**Revestimientos exteriores**				
3.3.1	Panel de acero ondulado 48 de instapanel	m2	31,7	$ 17.000	$ 538.900
3.4	Terminacion de muros existentes	m2	5,9	$ 25.000	$ 147.500
3.5	Grafica	GL	1	$ 400.000	$ 400.000
3.6	**Revestiminetos interiores**				
3.6.1	Fibrocemento 8mm	m2	98	$ 10.000	$ 980.000
3.6.2	Porcelanato Baño	m2	93,5	$ 11.000	$ 1.028.500
3.6.3	Muros Existentes	m2	250	$ 5.000	$ 1.250.000
3.6.4	Fieltro	m2	335	$ 5.000	$ 1.675.000
3.8	**Cielos**				
3.8.1	Cielo Fibrocemento	m2	39,5	$ 5.000	$ 197.500
3.8.2	Cielo Existente Fibrocemento	m2	125	$ 5.000	$ 625.000
3.9	**Revestimientos Ceramicos**				
3.9.1	Ceramica Piscina (piso y muro)	m2	98	$ 6.500	$ 637.000
3.9.2	Porcelanato Piso	m2	65	$ 14.000	$ 910.000
3.9.2	Porcelanato Piso Baño	m2	21	$ 10.000	$ 210.000
3.9.3	Piso de vinilico	m2	35,15	$ 10.000	$ 351.500
3.9.3	Cinta antideslizante	ml	36	$ 2.000	$ 72.000
3.10	**PUERTAS Y VENTANAS**				
3.10.1	Puertas				
3.10.1.1	Pv01	UN	1	$ 100.000	$ 100.000
3.10.1.2	P01	UN	1	$ 80.000	$ 80.000
3.10.1.3	P02	UN	3	$ 80.000	$ 240.000
3.10.1.4	Marcos de Puertas	UN	4	$ 50.000	$ 200.000
3.10.1.5	Topes de Gomas	UN	5	$ 15.000	$ 75.000
3.10.2	**VENTANAS**				
3.10.2.1	Paneles vidriados y Ventanas				
3.10.2.1.1	V01	UN	1	$ 150.000	$ 150.000
3.10.2.1.2	V02	UN	1	$ 150.000	$ 150.000
3.10.2.1.3	V03	UN	3	$ 150.000	$ 450.000
3.12	**PASAMANOS**				
3.12.1	Pasamanos de acero inoxidable	UN	1	250.000	250.000
3.12.2	Pasamanos 45 mm acero inoxidable	UN	1	250.000	250.000
3.13	MOLDURAS				
3.13.1	Guardapolbvo Porcelanato	ml	46	$ 3.000	$ 138.000
3.13.2	Guardapolvo Sanitario	ml	29	$ 3.000	$ 87.000
3.13.3	Cornizas Interiores	ml	55	$ 2.600	$ 143.000
3.14	PINTURAS Y BARNICES				
3.14.1	Pinturas Muros	m2	328	$ 2.900	$ 951.200
3.14.2	Pinturas Cielos	m2	164	$ 2.900	$ 475.600
3.14.3	Pinturas Anticorrosivo	m2	5	$ 2.900	$ 14.500
3.14.4	Esmalte sanitizante	m2	102	$ 3.500	$ 357.000
4.	**INSTALACIONES**				
4.1	Instalaciones Sanitarias				
4.1.1	Conexión a red existente	GL	1	$ 600.000	$ 600.000
4.1.2	Instalacion de agua potable	GL	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000

4.1.3	Alcantarillado	GL	1	$ 800.000	$ 800.000
4.2	Instalacion Gas	GL	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
4.3	Electricidad	GL	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
4.4	Calefaccion	GL	1	$ 900.000	$ 900.000
4.5	Equipos de Piscina	GL	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
5.	**ARTEFACTOS**				
5.1	Artefactos Sanitarios				
5.1.1	Inodoro de Loza Blanco	UN	1	$ 95.000	$ 95.000
5.1.2	Lavamanos	UN	1	$ 90.000	$ 90.000
5.2	**ACCESORIOS**				
5.2.1	Dispensador toalla papel secamanos acero inoxidable	UN	1	$ 80.000	$ 80.000
5.2.2	Dispensador de jabon Acero Inox. 800 cc	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
5.2.3	Dispensador Higienico Megarroll Acero Inox.	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
5.2.4	Barra Swing-Up acero inoxidable discapacitados	UN	1	$ 40.000	$ 40.000
5.2.5	Barra acero inoxidable discapacitados	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
5.2.6	Perchas	UN	1	$ 30.000	$ 30.000
5.2.7	Señaletica	UN	4	$ 15.000	$ 60.000
5.2.8	Silla elevadora de Piscina	UN	1	$ 3.700.000	$ 3.700.000
5.2.9	Extintores	UN	1	$ 30.000	$ 30.000
A.-	**AUMENTO DE OBRAS**				
I.-	**MAYORES OBRAS A PRECIOS DE OFERTA**				
2.7.1	**Estructura de Metalcom (cielo Baños)**				
2.7.2	Cerchas	UN	9	$ 150.000	1.350.000
2.6.2	OSB 9,5 mm (Cubierta baños)	m2	21,0	$ 10.000	210.000
3.6.4	Fieltro	m2	21	$ 5.000	105.000
2.6	**ELEMENTOS SEPARADORES VERTICAL (Muros reja -Sala de maquinas)**				
3.14.3	Pinturas Anticorrosivo	m2	24,0	$ 2.900	69.600
	SUB-TOTAL AUMENTO NETO A PRECIOS DE OFERTA			**$**	**1.734.600**
II.-	**OBRAS EXTRAORDINARIAS**				
2.6	**ELEMENTOS SEPARADORES VERTICAL (Muros reja -Sala de maquinas)**				
2.6.3	Estructura Acero	kg	534,34	$ 3.800	2.030.492
2.6.4	Quincalleria estructuras metalicas	GL	1	$ 93.770	93.770
4.4	Calefaccion por Calefactor 400KBTU Gas Propano MIL	GL	1	$ 2.200.000	2.200.000
	SUB-TOTAL AUMENTO NETO A PRECIOS CONVENIDOS			**$**	**4.324.262**
	TOTAL AUMENTO NETO			**$**	**6.058.862**
B.-	**DISMINUCION DE OBRAS**				
1.-	**DISMINUCIONES DE OBRAS A PRECIOS DE OFERTA**				
2.6	**ELEMENTOS SEPARADORES VERTICAL (Muros reja -Sala de maquinas)**				
2.6.1	Tabiqueria metalica metalcom	m2	15	$ 17.000	255.000
2.6.2	OSB 9,5 mm	m2	30	$ 10.000	300.000
3.2.1	Aislanglass rollopapel	m2	15	$ 5.000	75.000
3.3.1	Panel de acero ondulado 48 de instapanel	m2	15	$ 17.000	255.000
3.6.1	Fibrocemento 8mm	m2	15	$ 10.000	150.000
3.10.1.2	P01	UN	1	$ 80.000	80.000
4.	**INSTALACIONES Y TERMINACIONES**				
4.4	Calefaccion (Por Caldera)	GL	1	$ 900.000	900.000

3.14.3	Pinturas Anticorrosivo	m2	5	$ 2.900	14.500
	SUB-TOTAL DISMINUCION NETO A PRECIOS DE OFERTA			**$**	**2.029.500**
C.-	**RESUMEN AUMENTO DISMINUCION**				
	AUMENTOS DE CONTRATO			**$**	**6.058.862**
	DISMINUCION DE CONTRATO			**$**	**2.029.500**
	SALDO OBRAS EXTRAS			**$**	**4.029.362**
	GG	20%		**$**	**805.872**
	UT	10%		**$**	**402.936**
	TOTAL NETO			**$**	**5.238.171**
	IVA	19%		**$**	**995.252**
	TOTAL			**$**	**6.233.423**
D.-	**RESUMEN MODIFICACION DE CONTRATO**				
	TOTAL CONTRATO (ORIGINAL)			**$**	**85.833.284**
	MONTO OBRAS EXTRAS			**$**	**6.233.423**
	TOTAL CONTRATO MODIFICADO			**$**	**92.066.707**

6.0.0.- PORCENTAJES DE AVANCE

Estados de Pago	Montos Estados de Pago		
	Parcial	Acumulado	Porcentual
EP1	$ 8.268.715	$ 8.268.715	8,98%
EP2	$ 20.491.562	$ 28.760.277	31,24%
EP3	$ 16.829.736	$ 45.590.013	49,52%
EP4	$ 11.648.000	$ 57.238.013	62,17%
EP5	$ 19.861.933	$ 77.099.946	83,74%
EP6	$ 11.911.900	$ 89.011.846	96,68%
EP7	$ 3.054.861	$ 92.066.707	100,00%

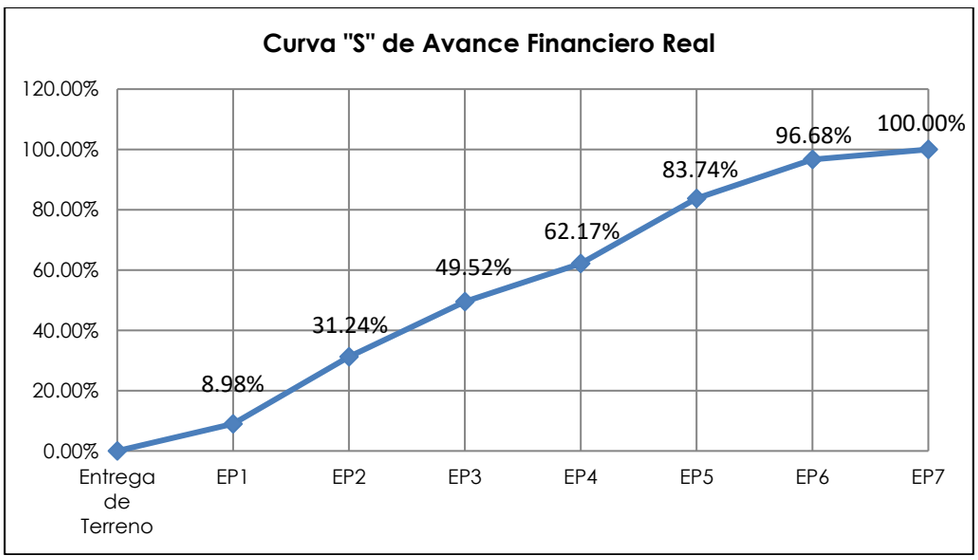

7.0.0.- ESTADO DE RENDICIÓN AL GORE MAULE

En relación a la rendición del último Estado de Pago (N°7) al GORE, el día 04 de marzo de 2022 se envió dicha rendición a la Oficina de Partes Virtual del GORE (gestiondedocumentos@goremaule.cl), con copia al administrador del proyecto (del GORE). Posteriormente, con fecha 22 de marzo de 2022 se consulta a esa entidad si la rendición está recibida y conforme, respondiendo afirmativamente.

8.0.0.- CERTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE GAS

Con respecto a la certificación de instalación de gas (TC6), el colega Aldo Chiple (quien está realizando esas gestiones), comenta que se ha mantenido en contacto con Víctor Monroy, quien se encuentra recopilando información con la SEC sobre certificaciones anteriores del gimnasio incluyendo bombonas de gas. Con toda esa información más los antecedentes aportados elaborará por su parte un presupuesto para mantención, certificación y actualización de las instalaciones (considerar que la certificación tiene vigencia por dos años, se debe renovar en ese período). Además, se indica que se deberán hacer algunas mejoras y cambios que serán indicados en el presupuesto.

La Autorización Sanitaria se encuentra aún disponible para cancelación según trámite en línea de la SEREMI (se debe cancelar una vez efectuada la mantención y certificación de las instalaciones).”

II. **NOTIFÍQUESE**, por la Unidad Técnica del Contrato, el presente Decreto Exento a la Empresa Constructora GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA., ya sea mediante la entrega personal a su representante, por correo electrónico si así se hubiese dispuesto; o bien, por carta certificada enviada al domicilio de la empresa si los métodos anteriores no fueran útiles. Debiéndose informar a la Dirección de Asesoría Jurídica a la casilla *juridico@parral.cl* la fecha en que se verificó la entrega personal o la remisión del correo electrónico –adjuntando la recepción conforme o el acuse de recibo-; o bien, la fecha en que la carta certificada fue recibida por la Oficina de correos de Parral y de la Comuna en que tuviera el domicilio la empresa, siendo que sea una distinta a la de Parral.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL Y ARCHÍVESE

ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA

PRU/MHT/ARC/pmh

Firmado digitalmente por PABLO ENRIQUE MUNOZ HENRIQUEZ

DISTRIBUCIÓN:

a) **COPIA PAPEL**
   1. Oficina de Partes I. Municipalidad de Parral.
   2. Empresa Constructora GÓMEZ Y LGONZÁLEZ INGENIERÍA Y MONTAJE LTDA.

b) **COPIA DIGITAL**
   1. Dirección de Asesoría Jurídica I. Municipalidad de Parral.
   2. Dirección de Control, I. Municipalidad de Parral.
   3. Dirección de Obras Municipales, I. Municipalidad de Parral.
   4. SECPLAN, I. Municipalidad de Parral.
   5. Dirección de Administración y Finanzas, I. Municipalidad de Parral.
   6. ITO, *eduardo.espinosa@parral.cl*
